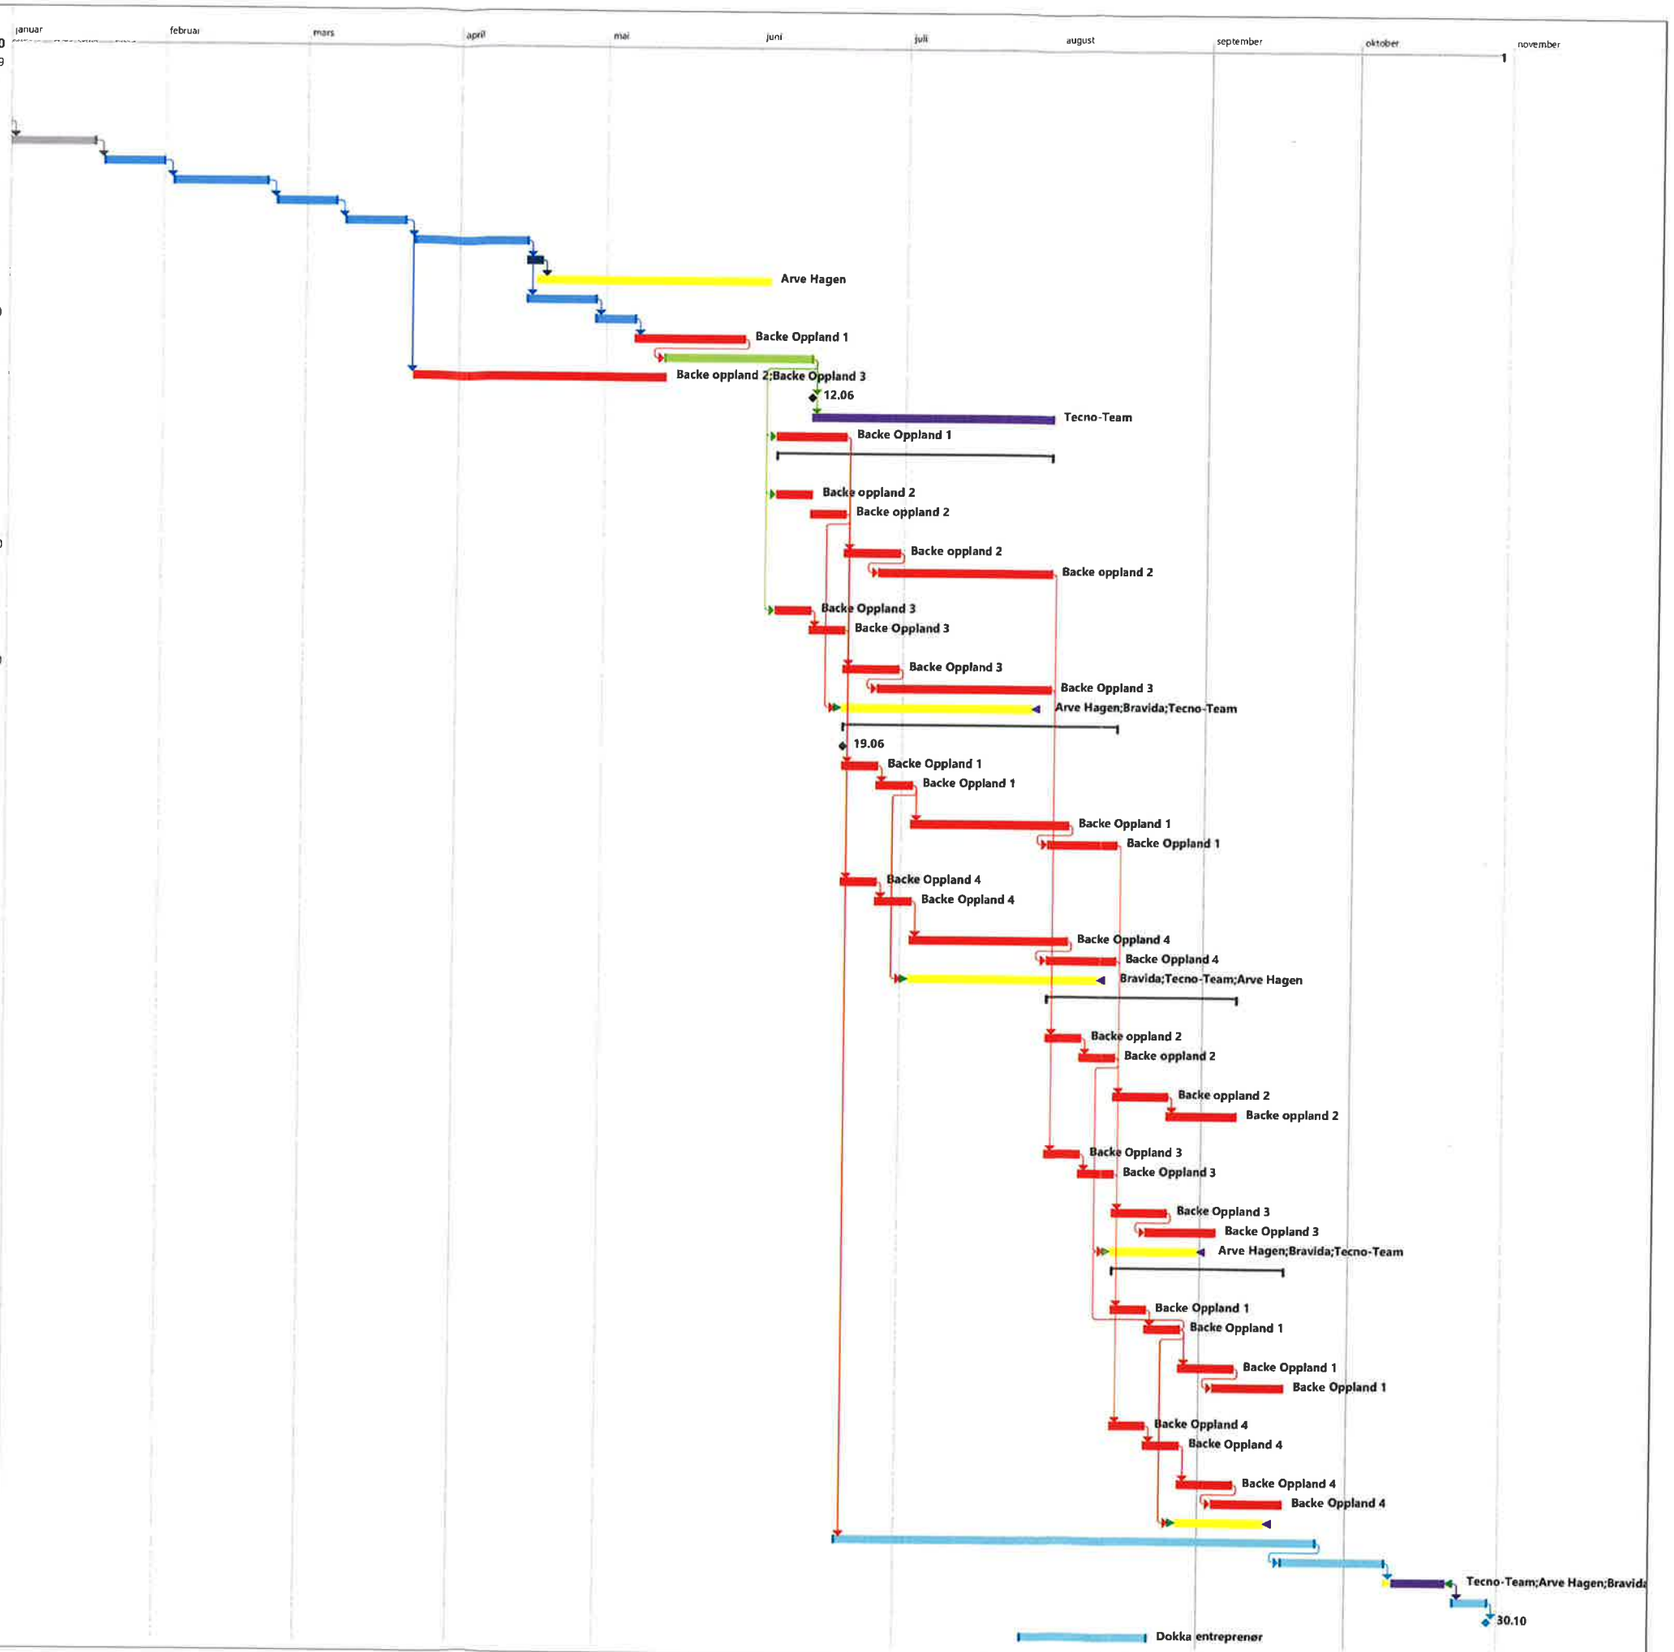ID	Aktivitetsn	Aktivitetsnavn	Varighet	Start	Slutt
0		**fremdriftplan Scandic viktoria**	**299 dager**	**to 01.08.19**	**fr 30.10.20**
1		Prosjektering ig søknad.	50 dager	to 01.08.19	on 09.10.19
2		IG BYGG	0 dager	fr 01.11.19	fr 01.11.19
3		Oppstart gravearbeider	0 dager	fr 01.11.19	fr 01.11.19
4		Omlegging av eks infrastruktur og etablering av nytt	40 dager	fr 01.11.19	ti 31.12.19
5		Graving av fundamenter	13 dager	on 01.01.20	fr 17.01.20
6		fundamenter og ringmurer	10 dager	ma 20.01.20	fr 31.01.20
7		betongarbeider plan 1 og dekke over plan 1 inkl montering Cabiner	15 dager	ma 03.02.20	fr 21.02.20
8		Betongarbeider plan 2 og dekke over plan 2 inkl cabiner	10 dager	ma 24.02.20	fr 06.03.20
9		Betongarbeider plan 3 og dekke over plan 3 inkl cabiner	10 dager	ma 09.03.20	fr 20.03.20
10		Betongarbeider plan 4 og dekke over plan 4 inkl cabiner	11 dager	ma 23.03.20	ti 14.04.20
11		Støvbinding av himlinger for oppstar sprinkel plan 1-3	3 dager	on 15.04.20	fr 17.04.20
12		Hovedstrekk sprinkel	30 dager	fr 17.04.20	ti 02.06.20
13		Betongarbeider plan 5 og dekke over plan 5	10 dager	on 15.04.20	ti 28.04.20
14		puss og flikk conform	5 dager	on 29.04.20	on 06.05.20
15		Teknisk rom og rytter på tak	14 dager	to 07.05.20	to 28.05.20
16		Taktekking	20 dager	on 13.05.20	to 11.06.20
17		Montasje ytterveggselemnter	30 dager	ma 23.03.20	ti 12.05.20
18		Tett bygg	0 dager	fr 12.06.20	fr 12.06.20
19		Arbeider i tekniske rom plan 1 og 6 og himling plan1	20 dager	fr 12.06.20	to 30.07.20
20		Tømmerarbeider plan 1	10 dager	fr 05.06.20	to 18.06.20
21		**plan 2**	**25 dager**	**fr 05.06.20**	**to 30.07.20**
22		Korridorvegger og sjakter sone 1 plan 2			
23		bindingsverk	5 dager	fr 05.06.20	to 11.06.20
24		platekledning	5 dager	fr 12.06.20	to 18.06.20
25		vegger i hotellrom sone 1			
26		bindingsverk	7 dager	fr 19.06.20	ma 29.06.20
27		platekledning	10 dager	fr 26.06.20	to 30.07.20
28		Korridorvegger og sjakter sone 2 plan 2			
29		bindingsverk	5 dager	fr 05.06.20	to 11.06.20
30		platekledning	5 dager	fr 12.06.20	to 18.06.20
31		Vegger i hotellrom sone 2			
32		bindingsverk	7 dager	fr 19.06.20	ma 29.06.20
33		platekledning	10 dager	fr 26.06.20	to 30.07.20
34		tekniske anlegg plan 2	15 dager	on 17.06.20	ti 28.07.20
35		**plan 3**	**25 dager**	**fr 19.06.20**	**to 13.08.20**
36		Korridorvegger og sjakter sone 1 plan 3	0 dager	fr 19.06.20	fr 19.06.20
37		bindingsverk	5 dager	fr 19.06.20	to 25.06.20
38		platekledning	5 dager	fr 26.06.20	to 02.07.20
39		vegger i hotellrom sone 1			
40		bindingsverk	7 dager	fr 03.07.20	ma 03.08.20
41		platekledning	10 dager	fr 31.07.20	to 13.08.20
42		Korridorvegger og sjakter sone 2 plan 3			
43		bindingsverk	5 dager	fr 19.06.20	to 25.06.20
44		platekledning	5 dager	fr 26.06.20	to 02.07.20
45		Vegger i hotellrom sone 2 plan 3			
46		bindingsverk	7 dager	fr 03.07.20	ma 03.08.20
47		platekledning	10 dager	fr 31.07.20	to 13.08.20
48		tekniske anlegg plan 3	15 dager	on 01.07.20	ti 11.08.20
49		**plan 4**	**27 dager**	**fr 31.07.20**	**ma 07.09.20**
50		Korridorvegger og sjakter sone 1 plan 4			
51		bindingsverk	5 dager	fr 31.07.20	to 06.08.20
52		platekledning	5 dager	fr 07.08.20	to 13.08.20
53		vegger i hotellrom sone 1			
54		bindingsverk	7 dager	fr 14.08.20	ma 24.08.20
55		platekledning	10 dager	ti 25.08.20	ma 07.09.20
56		Korridorvegger og sjakter sone 2 plan 4			
57		bindingsverk	5 dager	fr 31.07.20	to 06.08.20
58		platekledning	5 dager	fr 07.08.20	to 13.08.20
59		Vegger i hotellrom sone 2 plan 3			
60		bindingsverk	7 dager	fr 14.08.20	ma 24.08.20
61		platekledning	10 dager	fr 21.08.20	to 03.09.20
62		tekniske anlegg plan 4	15 dager	on 12.08.20	ti 01.09.20
63		**plan 5**	**25 dager**	**fr 14.08.20**	**to 17.09.20**
64		Korridorvegger og sjakter sone 1 plan 4			
65		bindingsverk	5 dager	fr 14.08.20	to 20.08.20
66		platekledning	5 dager	fr 21.08.20	to 27.08.20
67		vegger i hotellrom sone 1			
68		bindingsverk	7 dager	fr 28.08.20	ma 07.09.20
69		platekledning	10 dager	fr 04.09.20	to 17.09.20
70		Korridorvegger og sjakter sone 2 plan 4			
71		bindingsverk	5 dager	fr 14.08.20	to 20.08.20
72		platekledning	5 dager	fr 21.08.20	to 27.08.20
73		Vegger i hotellrom sone 2 plan 3			
74		bindingsverk	7 dager	fr 28.08.20	ma 07.09.20
75		platekledning	10 dager	fr 04.09.20	to 17.09.20
76		tekniske anlegg plan 5	15 dager	on 26.08.20	ti 15.09.20
77		Maling Byggtapet	55 dager	fr 19.06.20	to 24.09.20
78		Byggvask	15 dager	fr 18.09.20	to 08.10.20
79		Innregulering igangkjøring	10 dager	fr 09.10.20	to 22.10.20
80		flikk	5 dager	fr 23.10.20	to 29.10.20
81		OVERLEVERING	0 dager	fr 30.10.20	fr 30.10.20
82		UTOMHUSARBEIDER	20 dager	ma 27.07.20	fr 21.08.20
